




# Алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам общего пользования (утвержден распоряжением ДТДХ от 27.09.2022г. № 64)



**1 этап алгоритма действий инвестора**

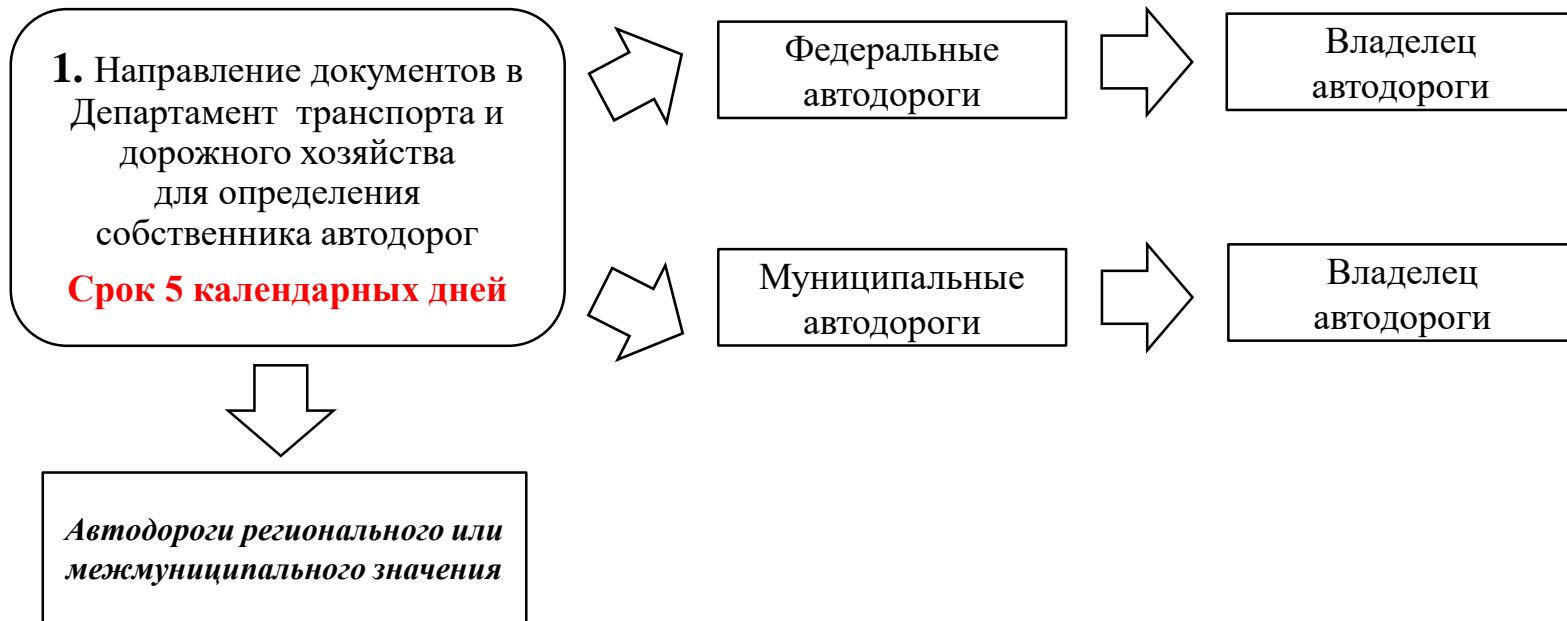

## 2 - 5 этапы алгоритма действий инвестора

*Автодороги регионального или межмуниципального значения*

2. Направление документов в ГБУ «Владупрадор»  
для получения технических условий

**Срок 5 календарных дней**

3. Направление документов в Департамент архитектуры и строительства для получения  
решения о подготовке документации по планировке территории

**Срок 10 рабочих дней**

4. Разработка документации по планировке территории.

**Срок, указанный в решении**

5. Направление документов в Департамент архитектуры и строительства для получения  
решения об утверждении документации по планировке территории


**Срок 15 рабочих дней**



## 6,7 и 8 этапы алгоритма действий инвестора


**6.** Направление документов в Департамент имущественных и земельных отношений для оформления правоустанавливающих документов на земельный участок под размещение примыкания

**Срок 35 календарных дней**



**7.** Направление документов в ГБУ «Владупрадор» для заключения соглашения об установлении сервитута

**Срок 20 календарных дней**



**8.** Оплата за установление сервитута

**Срок по соглашению**



## 9 -13 этапы алгоритма действий инвестора

**9.** Разработка и утверждение проектной документации на строительство примыкания к автодороге

**Срок по договору**

**10.** Направление документов в органы местного самоуправления, ГБУ «Владупрадор» для согласования проектной документации на строительство объекта (примыкания) к автодороге

**Срок 5 рабочих дней**

**11.** Направление документов в органы местного самоуправления с целью получения разрешения на строительство объекта (примыкания) к автодороге

**Срок 3 рабочих дня**

**12.** Выполнение работ по строительству объекта (примыкания к автодороге)

**Срок по договору**

**13.** Направление документов в органы местного самоуправления для получения разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию

**Срок 3 рабочих дня**



**Целевые сроки по алгоритму действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам общего пользования**

<b>Владимирская область</b>		<b>Калужская область</b>
Распоряжение Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области от 12.07.2022 № 38 <b>(было)</b>	Распоряжение Департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области от 27.09.2022 № 64 <b>(стало)</b>	Приказ Министерства транспорта Калужской области от 21.07.2022 № 131
<b>118 дней</b>	<b>101 день</b>	<b>105 дней</b>
